



OBJEKTA NOVIETNES PLĀNS

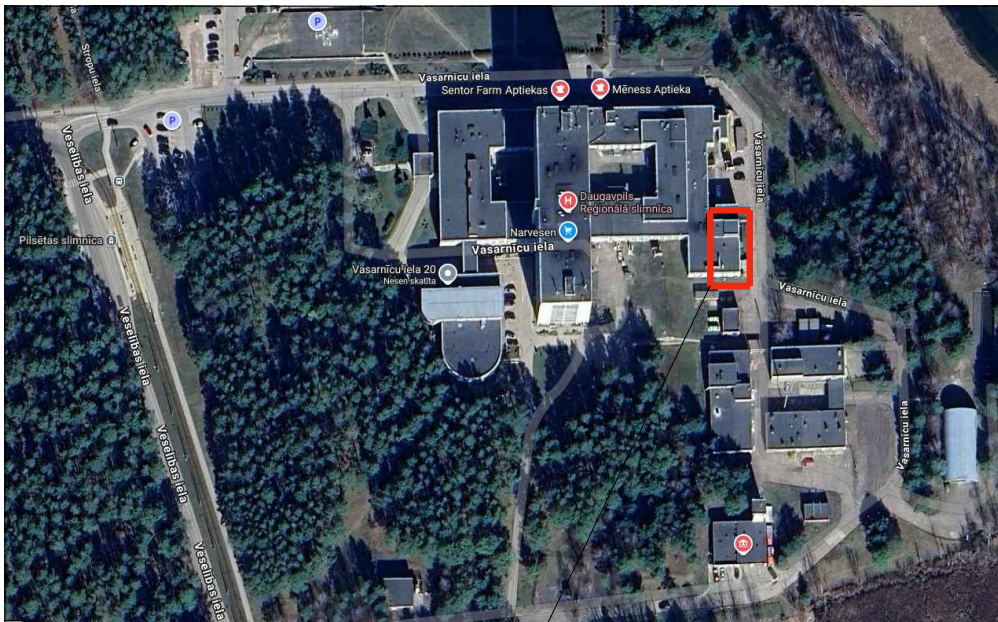


Telpu grupas novietojums ēkā
Vasarnīcu iela 20, Daugavpils



Būvlaukuma ģenerālplāns
M 1:500



Darba aizsardzībā lietotajās zīmes

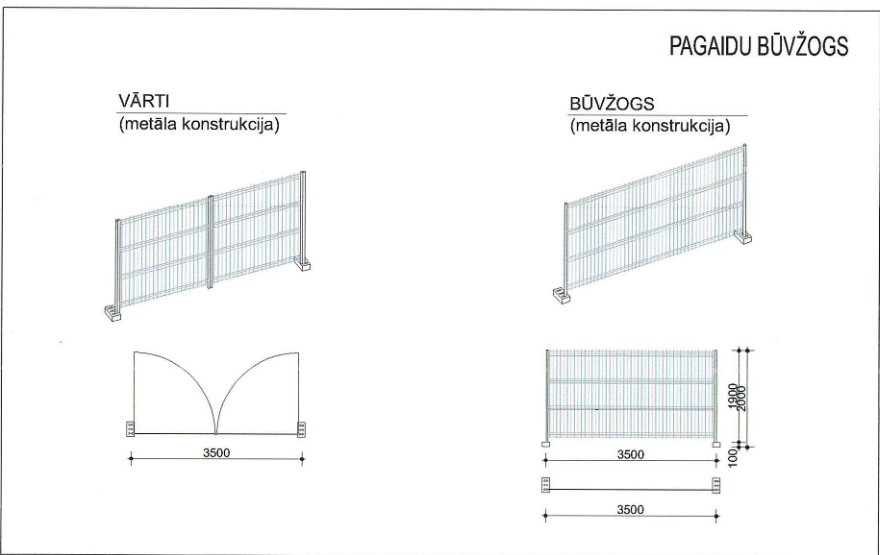

Norādījumi

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā un jānosaka ar pasūtītāju darbu veikšanas projekts (DVP).
2. Visi izmēri un augstuma atzīmes dotas metros.
3. Būvlaukumā būvdarbus veic saskaņā ar Būvnormatīviem, MK noteikumiem Nr. 92 "Drošības tehnika būvniecībā" un Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi".
4. Pieklūšana norobežotajai būvdarbu zonai pie ēkas pa esošo asfaltēto ceļu no Vasarnīcu ielas.
5. Būvdarbu laikā pagaidu elektroapgādes pieslēgumu paredzēt saskaņā ar ēkas īpašnieka norādījumiem.
6. Pagaidu EL sadali pieslēgt pie esošā SS. Pirms pieslēgšanas, SS izvēli precizēt ar projekta atbildīgo speciālistu.
7. Pagaidu ūdens pieslēgums - pie esošā ūdensvada (pieslēguma vietu saskaņot ar ēkas īpašniekam).
8. Lai nepieļautu būvgružu putekļu nokļūšanu gaisā, būvgružu konteiners noblīvējams un arī jāparedz būvgružu mitrināšana pirms un pēc izbēšanas.
9. Materiālu piegādei izmantot autoceltni.
10. Būvgružu izvešanai no augšējiem stāviem un būvmateriālu piegādei uz augšējos stāvos esošo būvdarbu zonu pēc iespējas izmantot pacelāju. Būvgružu nolaišana pieļaujama tikai maisos, izmantojot būvniecības pacelāju.
11. Zem pacelāja paredzēts ierīkot pagaidu slodzi izlīdzinošo dzelzsbetona ceļa paneli.
12. Esošos loģus un stiklojumu pacelāja darba zonā paredzēts aizseg.
13. Paredzētais būvgružu apjoms ir aptuveni 150m³.

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

- ① - Pārbūvējamā ēka - Daugavpils reģionālajā slimnīca
- Remontdarbu apjoms
- Būvdarbu robežas
- Būvlaukuma nožogojums h=2.0m, L=66.5m
- Materiālu nokrautne
Pagaidu materiālu novietojanas vietu pirms to iekļāšanas pārklāt ar plēvi vai ar plātnēm.
- Strādnieku kustības virziens
- Būvniecības transporta kustības virziens
- Pagaidu elektrolinijas, L=50,0m
- Prožektors, N=1gab.
- Ugunsdzēsamo aparātu kopskaits būvlaukumam un 2. stāva telpās- 4gab.
- Pirmās palīdzības sniegšanas vieta
- Stacionārie būvgružu konteineri, N=2gab.
- Būvtafele ne mazāk kā 1,2x1,2m, N=1gab.
- Darba aizsardzībā lietotajās zīmes, N=1gab.
- Celtniecības moduļi 6m x 2,5m -
Sadzīves telpa strādniekiem, N=2gab.
- Slēgta instrumentu/ materiālu noliktava
- Būvtransporta

- Transporta kustība norobežot atbilstoši "Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem" Ministru kabineta noteikumi Nr.421.

Būvlaukuma objektu eksplikācija		
N.p.k.	Nosaukums	Apjoms
①	Pārbūvējamā ēka - Daugavpils reģionālajā slimnīca	
②	Celtniecības modulis-Sadzīves telpa strādniekiem	2 gab.
③	Biotualetes	1 gab.
④	Utilizējamo būvgružu konteiners	2 gab.
⑤	Iebraucamie-izbraucamie vārti	1 gab.
⑥	Slēgta tipa materiālu novietnes konteiners	1 gab.
⑦	Pašizgāzējs (Borta automašīna HYUNDAI HD 170 vai analogs)	1 gab.
⑧	Frontālais iekrāvējs	1 gab.
⑨	Celtniecības pacelājs	1 gab.
⑩	Elektroinstrumentus	

Būvniecībai nepieciešamo mašīnu, mehānismu un autotransporta līdzekļu jaudas un skaits tiek precizēts darbu veikšanas projekta DVP stadijā.

Galvenais projektētājs: <div></div> SIA "FORTUM" LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503078964 Būvkomersanta reģ.Nr. 13877 18.Novembra iela 52, Daugavpils, LV-5401 tālr.27707398, e-mail: sia.fortum@gmail.com				Būvniecības ierosinātais: SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, Reģ.Nr. 41503029600		Projekta Nr. 26DRS	
Būvprojekta nosaukums un adrese: 							
