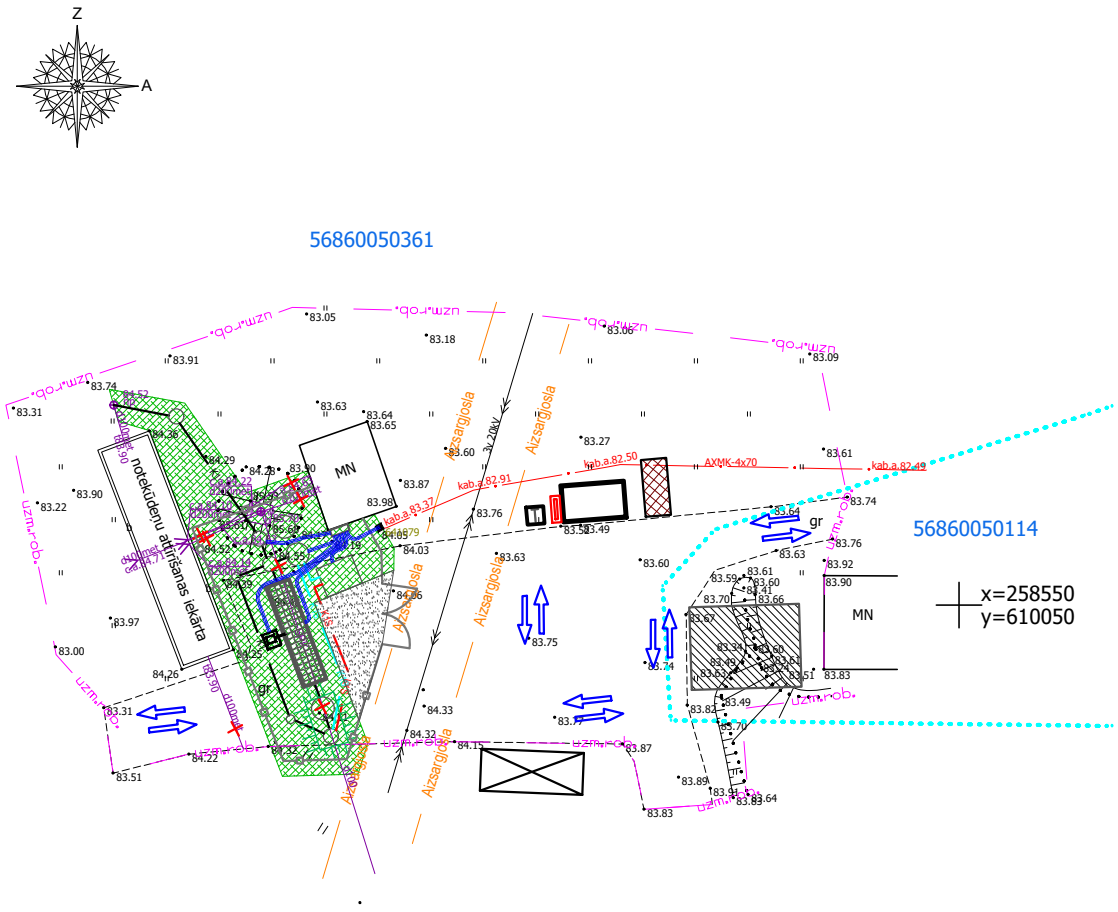


PIEZĪMES:

1. Elektroapgādes pagaidu pieslēgums - esošā elektrības sadalne, ūdens nodrošināms no autocisternas.
2. Būvniecības laikā bīstamās zonas norobežot ar brīdinājuma lentu.
3. Pie iebrauktuves (nobrauktuves) uz būvlaukuma teritoriju, kā arī visos celtniecības posmos, kur ir nepieciešams pēc darba nosacījumiem, uzstādīt labi redzamas un dienakts tumšajā laikā apgaismotas brīdinājuma un norādījuma zīmes.
4. Uz sastatnēm, materiālu novietnēs un laukumos, pie iebraukšanas būvlaukumā, izkārt brīdinājuma zīmes ar attiecīgiem uzrakstiem.
5. Būvmateriālu nokraušanas laukumu segums - zaļājs.
6. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt pieguļošās teritorijas apzaļumošanas darbus.

Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Būvmateriālu nokrautnes
- Būvgružu konteineri
- Biotualetes
- Būvtehnikas kustības virziens būvlaukumā
- Ugunsdzēsības stends
- Pagaidu instrumentu novietnes, paredzētas gan ģenerāluzņēmēju, gan apakšuzņēmēju vajadzībām.
- Pārvietojamā grunts

Būvprojekta izstrādātājs:	SIA"2RE" BRA Nr. 16576 Tālr. 29169497		Objekts:	Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve	Adrese: "Mazepiņi", Salas pagasts, Jēkabpils novads
			Rasējums:	*Būvdarbu ģenerālplāns*	Stadija: BP
Būvproj.d.vad	V.Siņicina-Kuļka		Mērogs: 1:500	Datums: 26.10.2022	Lapa: DOP-2 / Lapas: Skat.DOP-1
Izstrādāja	V.Siņicina-Kuļka				
