

TĪKLU MONTĀŽA ZEM ESOŠĀ KABEĻA

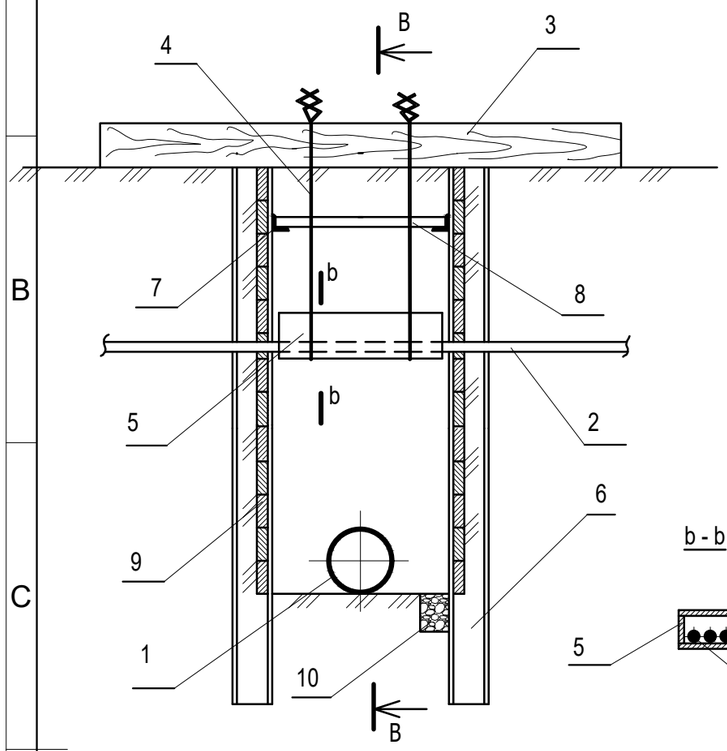

B - B

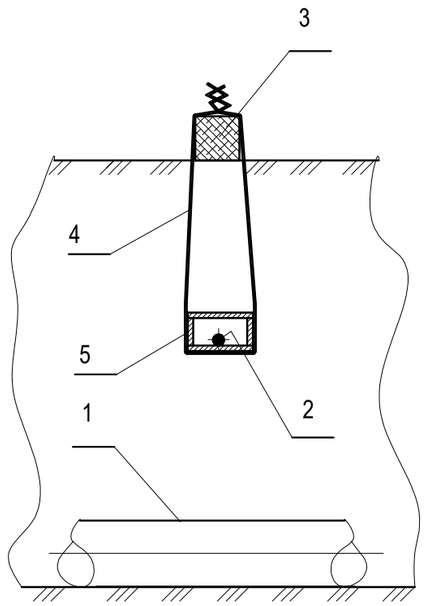

b - b

Darbu secība

1.Komunikāciju šķērsošanās zonā atšurfē esošo komunikāciju.
2.Ievieto atbalstsienas profilus.
3.Atrok būvbedri, līdz esošai komunikācijai, vienlaicīgi ievietojot grunts stiprinājuma dēļus.
4.Nostiprina esošo komunikāciju.
5.Atrok būvbedri, līdz izbūvējamās komunikācijas pamatnei, vienlaicīgi ievietojot grunts stiprinājuma dēļus.
6.Ierīko pamatni (smilšu spilvenu) izbūvējamai komunikācijai.
7.Jaunās komunikācijas izbūve (ieguldīšana, smilšu apbēruna izveidošana un blietēšana.
8.Tranšejas aizbēršana un atbalstsienas k-jas demontāža


Apzīmējumi

1 - izbūvējamais cauruļvads
2 - tranšeju šķērsojošais kabelis
3 - brusa vai gulsnis
4 - stiepļu vīts stiprinājums
5 - dēļu, vairogu kaste vai AROT kabeļu aizsargcaurules
6 - dubult T-profila sijas /ne retāk par 1,5 m/
7 - saites
8 - spraislis
9 - grunts nogāzes stiprinājuma dēļi
10 - pagaidu pazeminošā drenāža (aizpildīta ar vid. rupju granti)


Piezīmes

1.Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un darbu veikšanu skatīt paskaidrojuma rakstā.
2.Doto lapu skatīt kopā ar būvprojekta ŪKT, TS-CS, GP, ELT, EST daļām.
3.Kabeļu aizsardzības zonā (1 m attālumā no malējiem kabeļiem uz katru pusi) aizliegts veikt zemes darbus ar zemes rokamām mašīnām.
4.Noņemot asfalta segumu vai bruģi kabeļu atrakšanā, pneimatiskos nstrumentus vai lauzni nelietot dziļāk par 0,3m.
5.Kabeļu atrakšanas zonu nosaka rakšanas atļaujā un šo zonu paplašināt aizliegts.
6.Ja, veicot zemes darbus, atrok kabeli, kas nav norādīts dokumentācijā, darbi pārtraucami, nodrošināma kabeļa saglabāšana, izsaucami elektrotīklu pārstāvji. Ja kabelis sarauts, jāinformē EL tīkli un jāorganizē līnijas remonts par saviem līdzekļiem.
7.Kolektoru būvēt, pielietojot tranšeju atbalsta elementus "SBH".
8.Visi zemes darbi būvlaukuma teritorijā veicami vienlaicīgi ar arheoloģisko uzraudzību.

TĪKLU MONTĀŽA ZEM ESOŠĀ CAURUĻVADA

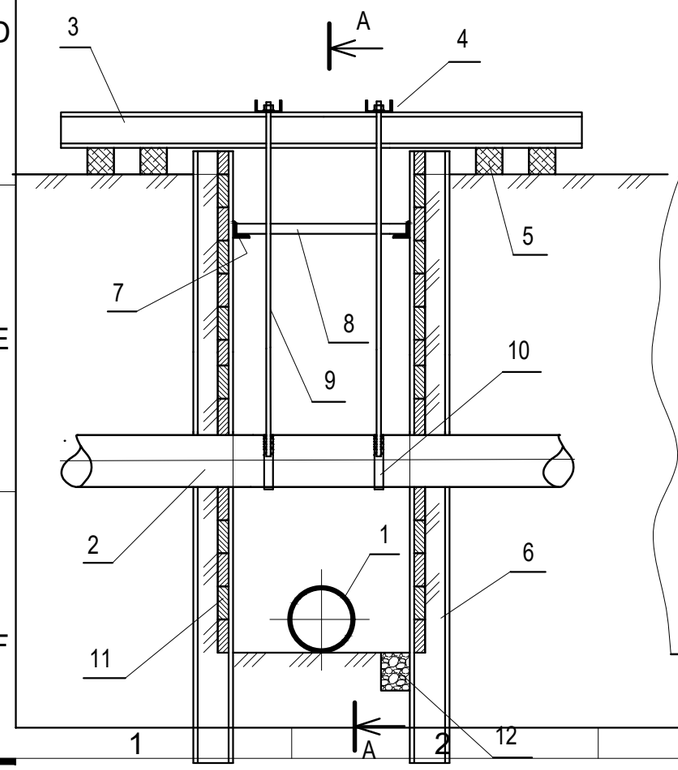

A - A

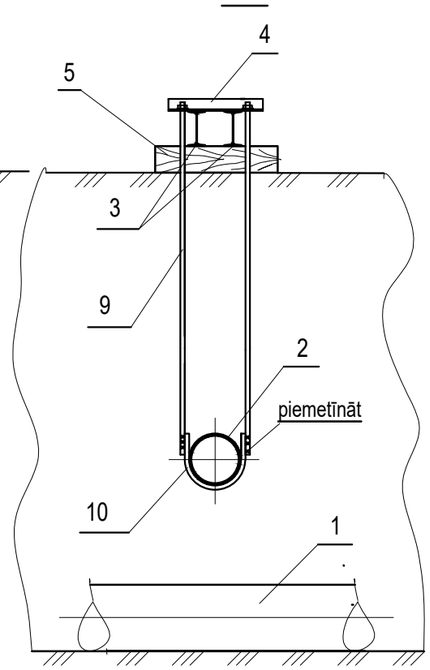

Apzīmējumi

1 - izbūvējamais cauruļvads
2 - tranšeju šķērsojošais cauruļvads
3 - dubult T- profila sija
4 - šķērši no U-profila sijām
5 - paliktnis
6 - dubult T-profila sijas /ne retāk par 1,5 m/
7 - saites
8 - spraislis
9 - tērauda stienis ar vītni galā un uzgriezni
10 - loksne
11 - grunts nogāzes stiprinājuma dēļi
12 - pagaidu pazeminošā drenāža (aizpildīta ar vid. rupju granti)

Būvniecības ierosinātājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība,
Reģ. Nr.90011524360,
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
DOP d.vad.	Didzis Dāle		08.03.2024.
Izstrādātājs	Jānis Grunte		08.03.2024.

Objekts:
Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkts Brasa, Rīga

Adrese:
Klusā iela un Gaujas iela

Lapas nosaukums:
Tīklu montāža zem esošā cauruļvada un esošā kabeļa

SIA "BM-projekts"
Būvk.reģ.Nr. 7008-RA2
Ezīši, Mārupes pag.,
Mārupes nov., LV-2166
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: DA-23-21-li
Arhīva Nr.: DA-23-21-li
Mērogs: BM

Stadija	Lapas	Marka	Ras. Nr.
BP		DOP	4

A3
