

PIEZĪMES:


1. Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un būvdarbu veikšanu skatīt skaidrojošā aprakstā;
2. Pēc būvniecības darbu beigām atjaunojami visi sabojātie ceļu segumi, līdz to sākotnējam stāvoklim;
3. Esošo inženierkomunikāciju šķērsojuma vietās rakt izmantojot roku darbu, nedrīkst izmantot mehānismus (traktorus, ekskavatorus, u.c.);
4. Visām tranšejām jābūt norobežotām ar brīdinājuma lentām vai celtniecības žogu;
5. Elektrības pieslēgums būvobjektā ir pieejams, saskaņojot ar Pasūtītāju elektrības pieslēguma vietu;
6. Būvdarbu ģenerālplāna norādītas iespējamās būvmateriālu novietnes atrašanās vietas. Būvuzņēmējs veido materiālu novietnes saskaņā ar darba tempu un organizāciju. Materiālus objektam pievest pēc nepieciešamības;
7. Būvniecības atkritumi nododami sertificētai atkritumu izvešanas firmai;

VISĀ PROJEKTĒJAMĀ TERITROIJĀ PIRMS SEGUMU BŪVNIECĪBAS VEIKT TERITORIJAS PLANĒŠANAS DARBUS ATBILSTOŠI VERTIKĀLAM PLĀNAM

APZĪMĒJUMI	APRAKSTS UN ATŠIFRĒJUMI
	Projektējamā teritorija
	Esošs koks
	Likvidējamas zāliena un apstādījumu segums
	Demontējamie esošie grants celiņu posmi
	Demontējams esošais betona plāksņu segums
	Demontējamie esošie betona pamati
	Izcērtamie koki
	Moduļu konteineris
	Portatīvā tualetes kabīne
	Būvgružu konteineris
	Būvmateriālu novietne
	Būvautotransporta kustības virziens būvniecības laikā
	Pagaidu būvniecības žogs

PAGAIDU ŽOGA FRAGMENTS

TIPS-PŽ-1

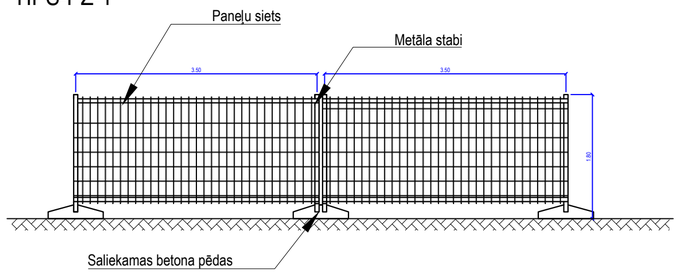

SIA "Veido vidi" Reģ. Nr.: LV43603058426 Tālr.: +371 22007585 e-pasts: kristine.dreija@gmail.com	Projekta nosaukums	**Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma izstrāde**						
	Objekta adrese	Rīgas iela 205, Jēkabpils, Jēkabpils nov., z.v.kadastra apzīmējums 56010012942						
	Datums		26.01.2024.	Pasūtītājs	Jēkabpils pilsētas pašvaldība			
	Proj. vadītāja	R. Truševska		Projekta Nr.	2023/5			
	Ainavu arh.	K. Dreija		Lapas nosaukums	Būvdarbu ģenerālplāns			
		A. Katlapa						
				Mērogs	Stadija	Marka	Lapas Nr.	Lapu sk.
					BP	DOP-1	2	3
