
Darbu organizācijas shēma



OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

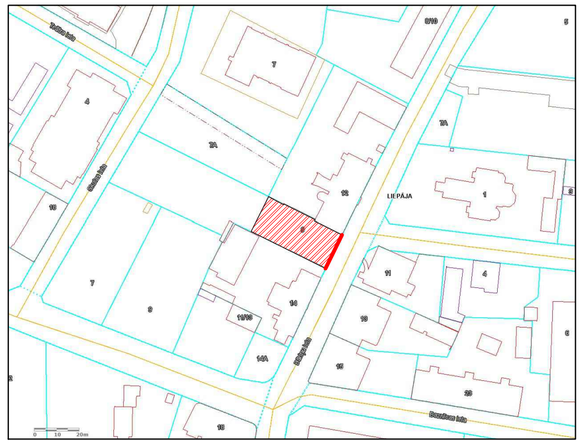

Galvenie būvlaukuma ierīkošanas elementi:
Sadzīves konteiners strādniekiem, 3x2.5m - 1gb
Pārvietojamas BIO tualetes - 1gb
Pagaidu nožogojums - 38m
Būvgružu konteiners - 1gb
Sastatnes - 1 komplekts

Galveno būvdarbu secība:

1. Būvlaukuma sagatavošana un ierīkošana
2. Pirms apmetuma nokalšanas izgatavot visu dekoratīvo profilu veidņu, rīvdēļu u.c. palīgmateriālu profilus dzegu un dekoratīvo detaļu atjaunošanai
3. Ēkas Bāriņu ielas fasādes apmetumu nokalt apjomā, kur tas vairs neturas pie ķieģeļu mūra
4. Apmetuma un detaļu atjaunošana - lietot viena ražotāja vienas sistēmas sastāvu (Ceresit vai līdzvērtīgs)
5. Cinkota skārda nosegelementu atjaunošana
6. Atjaunotās Bāriņu ielas fasādes krāsošana
7. Cinkota skārda lietus ūdes notekreņu montāža
8. Objekta nodošana ekspluatācijā

PIEZĪMES:

1. Faktiskos izmērus un apjomus precizēt uz vietas objektā.
2. Paskaidrojuma raksta ietvaros paredzēts veikt ēkas Skolas ielā 9, Liepājā, Bāriņu ielas pusē esošās fasādes vienkāršotu atjaunošanu.
3. Būvgruži jāiekrauj auto pašizgāzējā un jātransportē uz sertificētām būvgružu savākšanas vietām, saskaņojot ar Pasūtītāju. Nodrošināt, lai netiktu pieļauta liela apjoma būvgružu uzkrāšanās objektā.
4. Būvdarbus veikt ar Būvmehānismiem un sertificētiem kalibrētiem instrumentiem.
5. Būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši Darbu veikšanas projektus (DVP).
6. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem - darba likums; būvniecības likums; darba aizsardzības likums; MK noteikumi nr.500: "Vispārīgie būvnoteikumi", MK noteikumi nr.92: "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; MK noteikumi nr.238: "Ugunsdrošības noteikumi"; "Vides aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas.
7. Veicot būvdarbus jāievēro likumdošanā un normatīvajos aktos paredzētos vides aizsardzības pasākumus.
8. Izmantojot sastatnes, ir nepieciešams izveidot norobežojumus, kas pilda vairākas funkcijas, tai skaitā, pasargā pašu būvobjektu un tajā strādājošos no ārējās vides ietekmes (lietus, vējš, aukstums, karstums), kā arī, paaugstina darba drošību, samazinot objektā strādājošo personu traumu risku. Sastatnēm izmantot pārklājus lai nodrošinātu arī apkārtējo cilvēku un objektu, piemēram, auto, aizsardzību no sekām, kuras var radīt krītoši būvgruži. Sastatnēm izmantot sietu – ELTCOVER 70, vai armētu sastatņu plēvi - ELTCOVER 2000/4000.
9. Kā materiālu novietni plānots izmantot Pasūtītāja rīcībā esošās telpas Skolas ielas pusē, nepieciešamības gadījumā uzstādīt papildus noliktavas konteineri - iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.
10. Visas būvniecības laikā jānodrošina piekļuve blakus īpašumiem un operatīvajam transportam.
11. Būvstrādnieku un būvvadītāju sadzīves telpu ar pirmās palīdzības aptieciņu, instrumentu noliktavu un tualetes izvietot būvlaukuma norādītā vietā, skatīt plānā.
12. Būvdarbi veicami atbilstoši paskaidrojuma raksta dokumentācijai un saskaņā ar celtniecības normu un noteikumu prasībām.
13. Būvtransporta kustības virziens skatīt būvlaukuma plānā.
14. Konstrukciju montāžu veikt tikai pēc speciāli izstrādāta darbu veikšanas projekta.

PROJEKTA APZĪMĒJUMI

1	Sadzīves konteiners strādniekiem, 3x2.5m
	Pārvietojama BIO tualete
	Iebrauktuves Būvobjektā
	Būvtāfele
	Ugunsdzēsības inventāra stends
	Brīdinājuma zīme
	Pagaidu elektrības pieslēgums ar el.skaitītāju un galveno slēdzi
01	Pagaidu ūdens pieslēgums ar skaitītāju
	Medpunkts, pirmās palīdzības sniegšanas vieta
	Dzeramais ūdens
	Pagaidu nožogojums
BK	Būvgružu konteiners
	Projektējamā ēka

PASŪTĪTĀJS:
SIA "OC Liepāja"
Reģ. Nr. 40003421648
Jūrmalas parks 3, Liepāja, LV-3401

PROJEKTĒTĀJS:
SIA "LVCT"
Reģ.Nr. 42103037762, Būvkom.reģ. 2580-R
Meldru iela 1, Liepāja, LV-3401
e-pasts: lvct@lvct.lv

BŪVOBJEKTS:
Ēkas daļas (fasādes) atjaunošana Skolas ielā 9, Liepājā ar kad.Nr.17000330128002

RASĒJUMA NOSAUKUMS :
Darbu organizācijas shēma

DAĻAS VADĪTĀJS:	Guntis Kārkliņš	**DATUMS:**	20.03.2024
IZSTRĀDĀTĀJS:	Nauris Jaunzems	**REVĪZIJA:**	-
LAPAS FORMĀTS:	A2 (594*420)	**MĒROGS:**	1:250
STADIJA:	Paskaidrojuma raksts	**MARKA, NUMURS:**	DOP-01

Šis projekts ir SIA „LVCT" intelektuālais īpašums. Pasūtītājam ir tiesības to izmantot tikai šī projekta ietvaros. Projektu izmantot atkārtoti vai citā vietā tikai vienojoties ar intelektuālo īpašnieku SIA „LVCT"
