
Objekta izvietojuma shēma




1. un 4. etaps

būvdarbus veikt nakts laikā

2. etaps

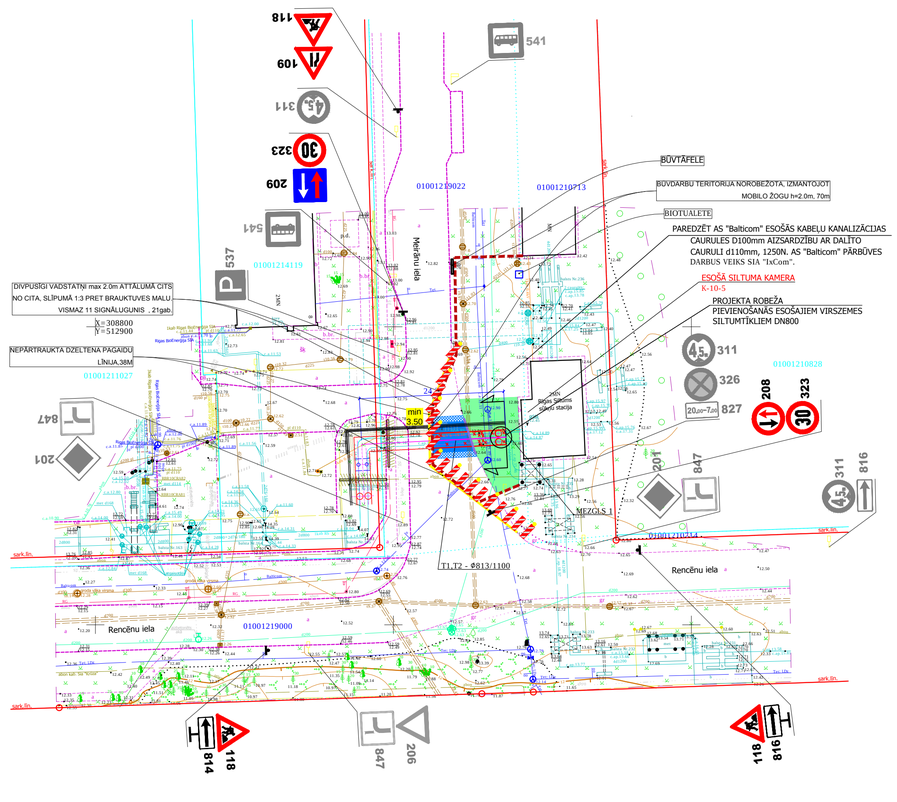

3. etaps

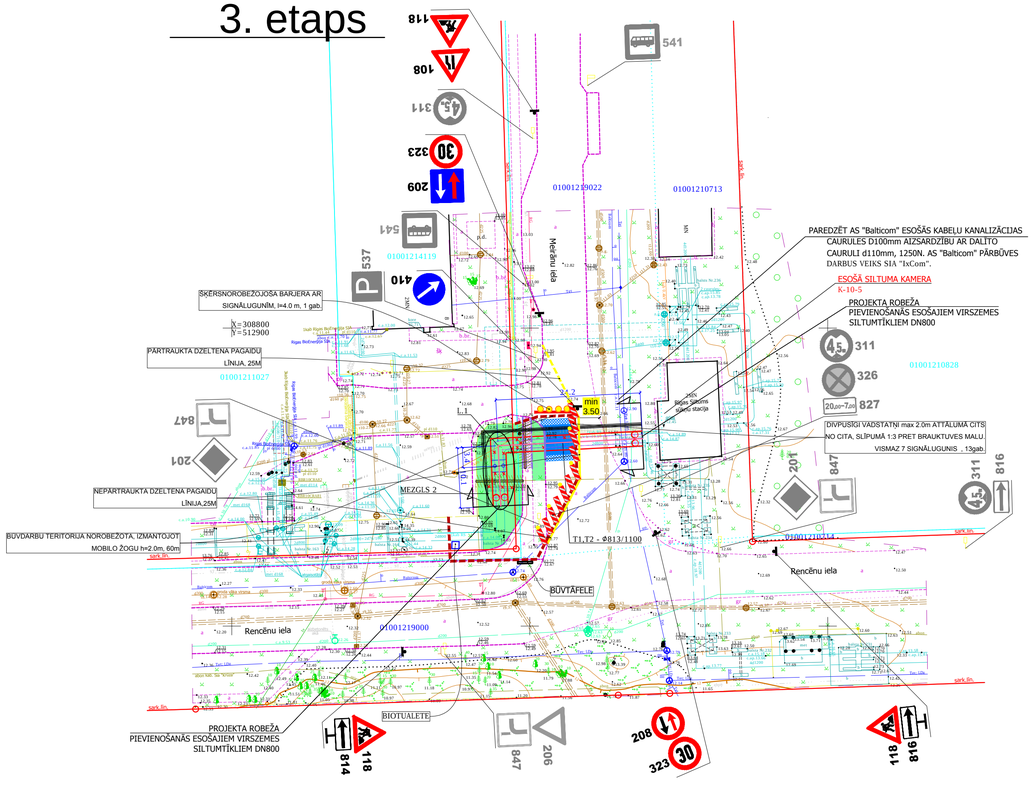

NORĀDĪJUMI

1. Būvgrāvju platums braucamās daļas un ietvju zonā, aprēķināts tā sienu nostiprināšanu ar inventāra vairogiem
2. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS-77:1; 2;3.
3. Darba vietu aprīkošana izpildāma atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 (02.10.2001.)
4. Segu konstrukciju skatīt lapās SAT- 9, 10
5. Būvdarbi paredzēti 4-6 metru augstumā. Būvdarbi veicami izmantojot sastatnes vai pacēlājus. Būvdarbus veikt ievērojot MK noteikumus Nr. 143 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ"
6. Atjaunotos segumus izbūvēt esošo segumu līmenos, saglabājot esošās augstuma atzīmes. Atjaunotajam bruģa segumam saglabāt esošo rakstu.
7. Atjaunojot esošos segumus, inženierkomunikāciju aku vākus izbūvēt atjaunoto segumu līmenī.
8. Būvējot inženierkomunikāciju trases gar esošām ēkām un būvēm, nodrošināt esošo konstrukciju pagaidu nostiprināšanu būvniecības laikā.
9. Būvdarbu laikā nodrošināt operatīvā transporta, iestāžu darbinieku un iedzīvotāju piekļuvi visām ēkām un būvēm.
10. Segumu atjaunošanas darbus veikt saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.RD-23-217-sn
11. Siltumtrases demontāžu virs Meirānu ielas braukt uves un brauktuves asfaltbetona seguma dilumkārtas atjaunošanu veikt nakts laikā, kad nekursē sabiedriskais trarisports.

DARBU VEIKŠANAS SECĪBA

1. etaps (darbi veicami nakts laikā, kad nekursē sabiedr. transports
   - slēgt visa veida satiksmi Meirānu ielas posmā, uzstādot attiecīgās ceļa zīmes;
   - veikt siltumtrases elementu demontāžu virs Meirānu ielas starp betona balstiem Nr.167 un Nr.168;
2. etaps
   - norobežot satiksmi Meirānu ielas posmā pie sūknu stacijas, saglabājot vienu braukšanas joslu vismaz 3.5 metru platumā, uzstādot attiecīgās ceļa zīmes;
   - demontēt virszemes siltumtrases posmu un betona balstu Nr.168;
   - izrakt būvbedri un izbūvēt projektēto bezkanālu siltumtrasi;
   - aizbērt būvbedri;
3. etaps
   - norobežot satiksmi Meirānu ielas posmā pretējā ielas pusē, saglabājot vienu braukšanas joslu vismaz 3.5 metru platumā, uzstādot attiecīgās ceļa zīmes;
   - demontēt virszemes siltumtrases posmu un betona balstus Nr.167, 166;
   - izrakt būvbedri un izbūvēt projektēto bezkanālu siltumtrasi;
   - aizbērt būvbedri;
4. etaps (darbi veicami nakts laikā, kad nekursē sabiedr. transports
   - slēgt visa veida satiksmi Meirānu ielas posmā, uzstādot attiecīgās ceļa zīmes;
   - veikt Meirānu ielas braukt uves asfaltēšanas darbus;

Pēc siltumtrases izbūves veikt teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus.

APZĪMĒJUMI.

- PĀRBŪVĒJAMIE BEZKANĀLA SILTUMTĪKLI
- PROJEKTA ROBEŽA
- ELEKTRĪBAS (SAKARU) KABEĻU AIZSARGJOSLA
- ESOŠO KABEĻU KOMUNIKĀCIJU AIZSARGČAULA
- DEMONTĒJAMIE VIRSZEMES SILTUMTĪKLI UN BALSTI
- ESOŠO KABEĻU KOMUNIKĀCIJU AIZSARGČAULA
- **BŪVDARBU TERITORIJA NOROBEŽOTA, IZMANTOJOT MOBILO ŽOGU**
- BŪVTĀFELE
- 206 **ESOŠĀS CEĻA ZĪMES**
- 118 **UZSTĀDĀMĀS CEĻA ZĪMES**
- BIOTUALETE

CC KLSIF 22220405

SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE STARP SILTUMA KAMERĀM K-10-5 UN K-10a-12 (PIE ĒKAS MEIRĀNU IELĀ 8), RĪGĀ PASŪTĪTĀJS: AS "RĪGAS SILTUMS" KADASTRA Nr. 01001219022, 01001214119						PASŪT.Nr.19/2023	
						DOP	
				SILTUMTĪKLI		Stadija	Lapa	Mērogs
BPV	A.Karlevica		22.12.2023			BP	2	1:500
BPDV	V.Karlevics		22.12.2023					
Izstrādāja	V.Karlevics		22.12.2023	DARBU ORGANIZĀCIJAS PLĀNS, SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS PLĀNS		SIA "Bek - Konsult" Būvk. reģ. Nr. 3554-R		
