Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam projekta "Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Riežupē" ietvaros

Reģistrēts Kuldīgas novada pašvaldībā
09.09.2025. ar Nr. 0938/2024/V-2

VIENOŠANĀS Nr. 2

Pie 27.11.2024. noslēgtā līguma Nr. 0938/2024 „Apvienotā projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība objektā "Transporta būves (caurtekas) pārbūve dabas parka "Riežupe" teritorijā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā"
ID Nr. KNP 2024/60-K/EJZAF"

Kuldīgā *Datums skatāms laika zīmogā*

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, turpmāk – **Pasūtītājs**, tās domes priekšsēdētājas vietnieka Arta Roberta personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Pašvaldību likumu un Pasūtītāja nolikumu, no vienas puses, un

SIA "KATLERI", reģ. Nr. 40103073727, turpmāk – **Izpildītājs**, tā valdes locekļa Arņa Grīntāla personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Komerclikumu un sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šo Vienošanos par turpmāko:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Vienošanās tiek slēgta ievērojot:

1.1. 27.11.2024. Līguma Nr. 0938/2024 "Apvienotā projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība objektā "Transporta būves (caurtekas) pārbūve dabas parka "Riežupe" teritorijā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā" ID Nr. KNP 2024/60-K/EJZAF", (turpmāk – Līgums) 7.4.1., 7.4.3. 7.5., 11.2., 11.3.2., 16.5. punktus;

1.2. Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmā daļa paredz iepirkuma līguma grozījumu pieļaujamību, ja paredzamie grozījumi nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) (..) un tie atbilst minētā panta nosacījumiem.

Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punkts paredz, ka: *Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 1) iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem;2) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt*.


1.3. Līguma 7.2. punkts, saskaņā ar Vienošanos Nr. 1 paredz, ka: *Ievērojot šī Līguma, Vienošanās Nr.1, Iepirkuma noteikumus un Izpildītāja piedāvājumu (Darbu izpildes grafiku), Darbu izpildi Izpildītājs apņemas veikt 10 (desmit) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, nodrošinot Būvdarbu izpildei nepieciešamās būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādei tiek izstrādāts 4 (četru) mēnešu un 2 (divu) nedēļu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas";*

Līguma 7.4. punkts paredz, ka: *Šī Līguma izpildes termiņu, ievērojot Līgumā noteikto kārtību, puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos rakstveidā šādos gadījumos: 7.4.1. ja nepārvaramas varas vai tehnoloģiskās pauzes rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto Darbu izpilde; (..)* 7.4.3. *ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi*".

1.4. Par būvdarbu izpildes termiņu ietekmējošiem nelabvēlīgiem laika apstākļiem:

1.4.1. Darbi sākotnēji būtu bijuši jāpabeidz 27.09.2025.

1.4.2. Pasūtītājs 08.09.2025. saņēmis Izpildītāja iesniegumu ar argumentāciju par Darbu izpildi kavējošiem laika apstākļiem 2025. gada būvniecības sezonā, kas fiksēti būvdarbu žurnāla ierakstos, meteoroloģiskās stacijas Kuldīgā pārskata datos (https://videscentrs.lvgmc.lv/noverojumu-arhivs/meteo/30048/active/4570/2025-04-01/2025-08-01):

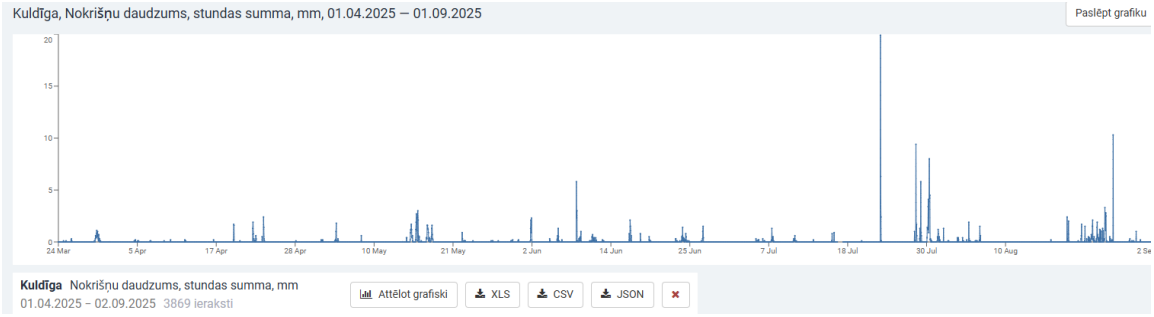

un pievienotajās fotofiksācijās.

1.4.3. Darbu izpildi kavējušo meteoroloģisko laika apstākļu, t.i., lietus nokrišņu radītā būvobjekta pārmitrinājuma dēļ, Darbus tehnoloģiski nav bijis iespējams veikt gan tieši konkrētajās nokrišņu dienās (kopskaitā 27 dienas), gan arī laika periodos pēc nokrišņu dienām, t.i., līdz brīdim, kad sasniegts Darbu izpildei pieļaujams grunts mitrums. Situācija Objektā fiksēta arī ierakstos būvdarbu žurnālā. Puses ņem vērā, ka aktā minēto darbu izpildi tehnoloģiski bija iespējams (turpināt) veikt tikai pēc nokrišņu daudzuma mazināšanās un to uzsūkšanās gruntī, proti, grunts pārmitrinājums samazinās tikai vairāku dienu laikā pēc pēdējo būtisko nokrišņu dienas, turklāt lietus turpinājies arī pēc ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgajiem un nelabvēlīgajiem klimatisko apstākļu dienām.

1.4.4. Ievērojot minētos apstākļus, termiņš pagarināms par Izpildītāja pieprasīto laika periodu, t.i., līdz 31.10.2025.

1.5. Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, Puses konstatē un norāda, ka bez šo grozījumu veikšanas nav iespējams nodrošināt Līguma pilnvērtīgu izpildi, tie nepārsniedz apjomu, kas nepieciešams Līguma kvalitatīvai izpildei, un ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt.

Izmaiņas veiktas tikai pēc rūpīgas visu apstākļu analīzes, izmaiņu mērķis ir nodrošināt minimāli nepieciešamos resursus, lai Līgumā paredzētie darbi tiktu izpildīti un nodrošinātu būves funkcionalitāti tai paredzētajiem mērķiem.

Puses konstatē, ka Līguma izpildes termiņa pagarinājumu ierosinošie un pamatojošie apstākļi atbilst Līgumā paredzētajiem termiņa pagarināšanu pieļaujošiem nosacījumiem, proti, iepriekš norādītie iemesli tieši ir ietekmējušas darbu izpildes termiņu.

Puses konstatē, ka Iesniegumā norādītais termiņa palielinājums minētajiem darbu veidiem un kavējošajiem apstākļiem uzskatāms par adekvātu veicamo darbu veidiem un daudzumam un uz tā pamata veiktajiem darbietilpības aprēķiniem, par šo darbu veikšanai nepieciešamo termiņu, kā arī kavējuma iemesliem un to novēršanai nepieciešamiem termiņiem.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

Puses, ņemot vērā šīs Vienošanās 1.punktā norādīto, vienojas izteikt Līguma 7.3. punktu šādā jaunā redakcijā:

*"7.2. Ievērojot šī Līguma, Vienošanās Nr.1. un Nr.2., Iepirkuma noteikumus un Izpildītāja piedāvājumu (Darbu izpildes grafiku), Darbu izpildi Izpildītājs apņemas veikt līdz **2025. gada 31.oktobrim**, nodrošinot Būvdarbu izpildei nepieciešamās būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādei tiek izstrādāts 4 (četru) mēnešu un 2 (divu) nedēļu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas".*

3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un viss, kas netiek regulēts ar šo Vienošanos apspriežams pēc Līguma noteikumiem.

3.2. Vienošanās stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.3. Šī Vienošanās sastādīta latviešu valodā elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

3.4. Vienošanās pievienots pielikums – Iesniegums.

4. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība	SIA "KATLERI"
Reģ. Nr. 90000035590	reģ. Nr. 40103073727
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301	Juridiskā adrese: Katleru iela 19, Āņi, Ādažu nov.
Kuldīgas novads, LV-3301	e-pasts: info@katleri.lv
	T. 29254050
Paraksts* Artis Roberts	Paraksts * Arnis Grīntāls

**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU*
